

# 骨材試験成績表

AS

株式会社熊野技建 御中

2023年 10月 11日

西日本高速道路エンジニアリング中国株式会社

広島支店 広島総合事務所


統括所長 廣本 輝夫



ご依頼の材料試験結果は下記のとおりです。

業務名	材料試験					
産地	—					
試験料名	再生砂	骨材の種類	—	最大寸法(mm)	2.36	
ふるい分け試験						
呼び寸法	通過質量百分率(%)		試験	実測値	規格値	
9.5 mm	100		密度 (g/cm <sup>3</sup> )	表乾	2.509	2.45 以上
4.75	100			かさ	2.442	—
2.36	93			見掛	2.618	—
1.18	69		吸水率 (%)	2.76	3.0 以下	
600 μm	46		粗粒率	2.54	—	
300	26		安定性損失量 (%)	1.6	12 以下	
150	12		単位容積質量 (kg/L)	1.54	—	
75	3		微粒分量 (%)	—	—	
受皿	0		粘土塊量 (%)	0.06	0.25 以下	

粒度曲線

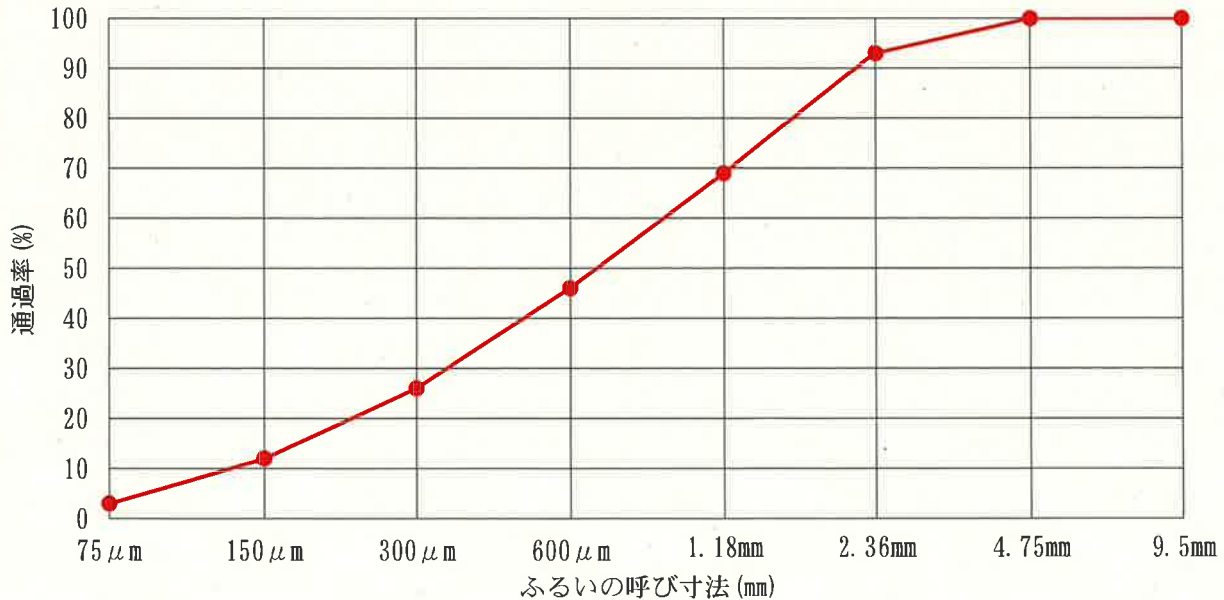

受付番号 : D23-108

確認者	試験者
